# CABLEADO ESTRUCTURADO ARS SEMMA

| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo | Fin | Predi | Nombres de los recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | **Cableado estructurado Semma** | **90%** | **113.75 días** | **lun 4/9/23** | **dom 10/12/2** | | |
| 3 | ✓ | | **FASE DE INICIO** | **100%** | **2.75 días** | **lun 4/9/23** | **mié 6/9/23** | | |
| 4 | ✓ | | Reunion Inicial | 100% | 1 día | lun 4/9/23 | lun 4/9/23 | | |
| 5 | ✓ | | Levantamientos | 100% | 3 días | lun 4/9/23 | mar 5/9/23 | 4 | |
| 6 | ✓ | | Presentacion y aprobacion de diceño | 100% | 3 días | mar 5/9/23 | mié 6/9/23 | 5 | |
| 7 | | | **FASE DE EJECUCION** | **89%** | **109 días** | **mié 6/9/23** | **sáb 9/12/23** | | |
| 8 | | | **EDIFICIO PRINCIPAL** | **89%** | **109 días** | **mié 6/9/23** | **sáb 9/12/23** | | |
| 9 | ✓ | | Piso 2 - Realización de canalizaciones | 100% | 2 días | mié 6/9/23 | vie 8/9/23 | 6 | |
| 10 | ✓ | | Piso 2 - Cableado UTP y Fibra piso 3 | 100% | 3.55 días | lun 11/9/23 | vie 15/9/23 | 9 | |
| 11 | ✓ | | Piso 2 - Instalación 49 Faceplate | 100% | 1 día | vie 15/9/23 | lun 18/9/23 | 10 | |
| 12 | ✓ | | Piso 2 - Conexión de cableado en Rack | 100% | 1 día | lun 18/9/23 | mar 19/9/23 | 11 | |
| 13 | ✓ | | Reunión de seguimiento | 100% | 0 días | mar 19/9/23 | mar 19/9/23 | 12 | |
| 14 | ✓ | | Piso 1 - Realización de canalizaciones | 100% | 2 días | lun 18/9/23 | mié 20/9/23 | 13 | |
| 15 | ✓ | | Piso 1 - Cableado | 100% | 2 días | mar 19/9/23 | vie 22/9/23 | 14 | |
| 16 | ✓ | | Piso 1 - Instalación 41 Faceplate | 100% | 4 días | lun 25/9/23 | vie 29/9/23 | 15 | |
| 17 | ✓ | | Piso 1 - Cambio de Rack | 100% | 1 día | vie 29/9/23 | sáb 30/9/23 | 16 | |
| 18 | ✓ | | Piso 1 - Instalación y Conexión de cableado en Rack | 100% | 2 días | lun 2/10/23 | mié 4/10/23 | 17 | |
| 19 | ✓ | | Reunión de seguimiento | 100% | 0 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 18 | |
| 20 | ✓ | | Piso 1 - Realización de canalizaciones | 100% | 3 días | mar 3/10/23 | vie 6/10/23 | 19 | |
| 21 | ✓ | | Piso 1 - Instalación 10 Faceplate | 100% | 1 día | mar 3/10/23 | jue 5/10/23 | 20 | |
| 22 | ✓ | | Piso 1 - Cableado Fibra hacia anexo y UTP | 100% | 2 días | jue 5/10/23 | lun 9/10/23 | 21 | |
| 23 | ✓ | | Piso 1 - Instalación de Rack | 100% | 1 día | lun 9/10/23 | mar 10/10/2 | 22 | |
| 24 | ✓ | | Piso 1 - Instalación y Conexión de cableado en Rack | 100% | 1 día | mar 10/10/2 | mié 11/10/2 | 23 | |
| 25 | ✓ | | Reunión de seguimiento | 100% | 0 días | mié 11/10/2 | mié 11/10/2 | 24 | |
| 26 | ✓ | | Piso 3 - Realización de canalizaciones | 100% | 1 día | mié 11/10/2 | jue 12/10/23 | 25 | |
| 27 | ✓ | | Piso 3 - Cableado | 100% | 1 día | jue 12/10/23 | vie 13/10/23 | 26 | |
| 28 | ✓ | | Piso 3 - Instalación 115 Faceplate | 100% | 2 días | vie 13/10/23 | mar 17/10/2 | 27 | |
| 29 | ✓ | | Piso 3 - Instalación y Conexión de cableado en Rack | 100% | 2 días | mar 17/10/2 | jue 19/10/23 | 28 | |
| 30 | ✓ | | Reunión de seguimiento | 100% | 0 días | jue 19/10/23 | jue 19/10/23 | 29 | |
| 31 | ✓ | | **INSTALACION FIBRA OPTICA** | **100%** | **5 días** | **lun 20/11/23** | **vie 24/11/23** | | |
| 32 | ✓ | | Instalacion fibra optica entre edificio Principal y Edificio 1000X1000 | 100% | 3 días | lun 20/11/23 | mié 22/11/23 | | |
| 33 | ✓ | | Instalacion Fibra optica Edificio Principal | 100% | 2 días | jue 23/11/23 | vie 24/11/23 | 32 | |
| 34 | ✓ | | **EDIFICIO 1000X1000** | **100%** | **5.63 días** | **vie 24/11/23** | **mié 29/11/2** | | |
| 35 | ✓ | | 1000x1000 - Adecuación de canalizaciones | 100% | 2.63 días | vie 24/11/23 | dom 26/11/2 | | |
| 36 | ✓ | | 1000x1000 - Cableado | 100% | 1 día | dom 26/11/2 | lun 27/11/23 | 35 | |
| 37 | ✓ | | 1000x1000 - Instalación 44 Faceplate | 100% | 1 día | lun 27/11/23 | mar 28/11/2 | 36 | |
| 38 | ✓ | | 1000x1000 - Conexión de cableado en Rack | 100% | 1 día | mar 28/11/2 | mié 29/11/2 | 37 | |
| 39 | ✓ | | **San Cristobal** | **100%** | **5 días** | **mié 29/11/2** | **dom 3/12/2** | | |
| 40 | ✓ | | Canalizacion y Cableado | 100% | 1 día | mié 29/11/2 | mié 29/11/2 | | |
| 41 | ✓ | | Instalacion Faceplate, conexión en Rack y Certificacion | 100% | 1 día | vie 1/12/23 | vie 1/12/23 | 40 | |
| 42 | | | **Azua** | **0%** | **3 días** | **sáb 2/12/23** | **dom 3/12/2** | | |
| 43 | | | Canalizacion y Cableado | 0% | 2 días | sáb 2/12/23 | dom 3/12/23 | 41 | |
| 44 | | | Instalacion Faceplate, conexión en Rack y Certificacion | 0% | 1 día | dom 3/12/23 | dom 3/12/23 | 43 | |
| 45 | | | **Barahora** | **0%** | **3 días** | **dom 3/12/2** | **mié 6/12/23** | | |
| 46 | | | Canalizacion y Cableado | 0% | 2 días | dom 3/12/23 | mar 5/12/23 | 44 | |
| 47 | | | Instalacion Faceplate, conexión en Rack y Certificacion | 0% | 1 día | mar 5/12/23 | mié 6/12/23 | 46 | |
| 48 | ✓ | | **La Romana** | **100%** | **3 días** | **mié 6/12/23** | **sáb 9/12/23** | | |
| 49 | ✓ | | Canalizacion y Cableado | 100% | 2 días | mié 6/12/23 | vie 8/12/23 | 47 | |
| 50 | ✓ | | Instalacion Faceplate, conexión en Rack y Certificacion | 100% | 1 día | vie 8/12/23 | sáb 9/12/23 | 49 | |
| 51 | | | **FASE DE CIERRE** | **75%** | **2 días** | **sáb 9/12/23** | **dom 10/12/2** | | |
| 52 | ✓ | | Realización de planos Asbuilt | 100% | 1 día | sáb 9/12/23 | dom 10/12/2 | 50 | |
| 53 | | | Entrega de proyecto | 50% | 1 día | dom 10/12/2 | dom 10/12/2 | 52 | |

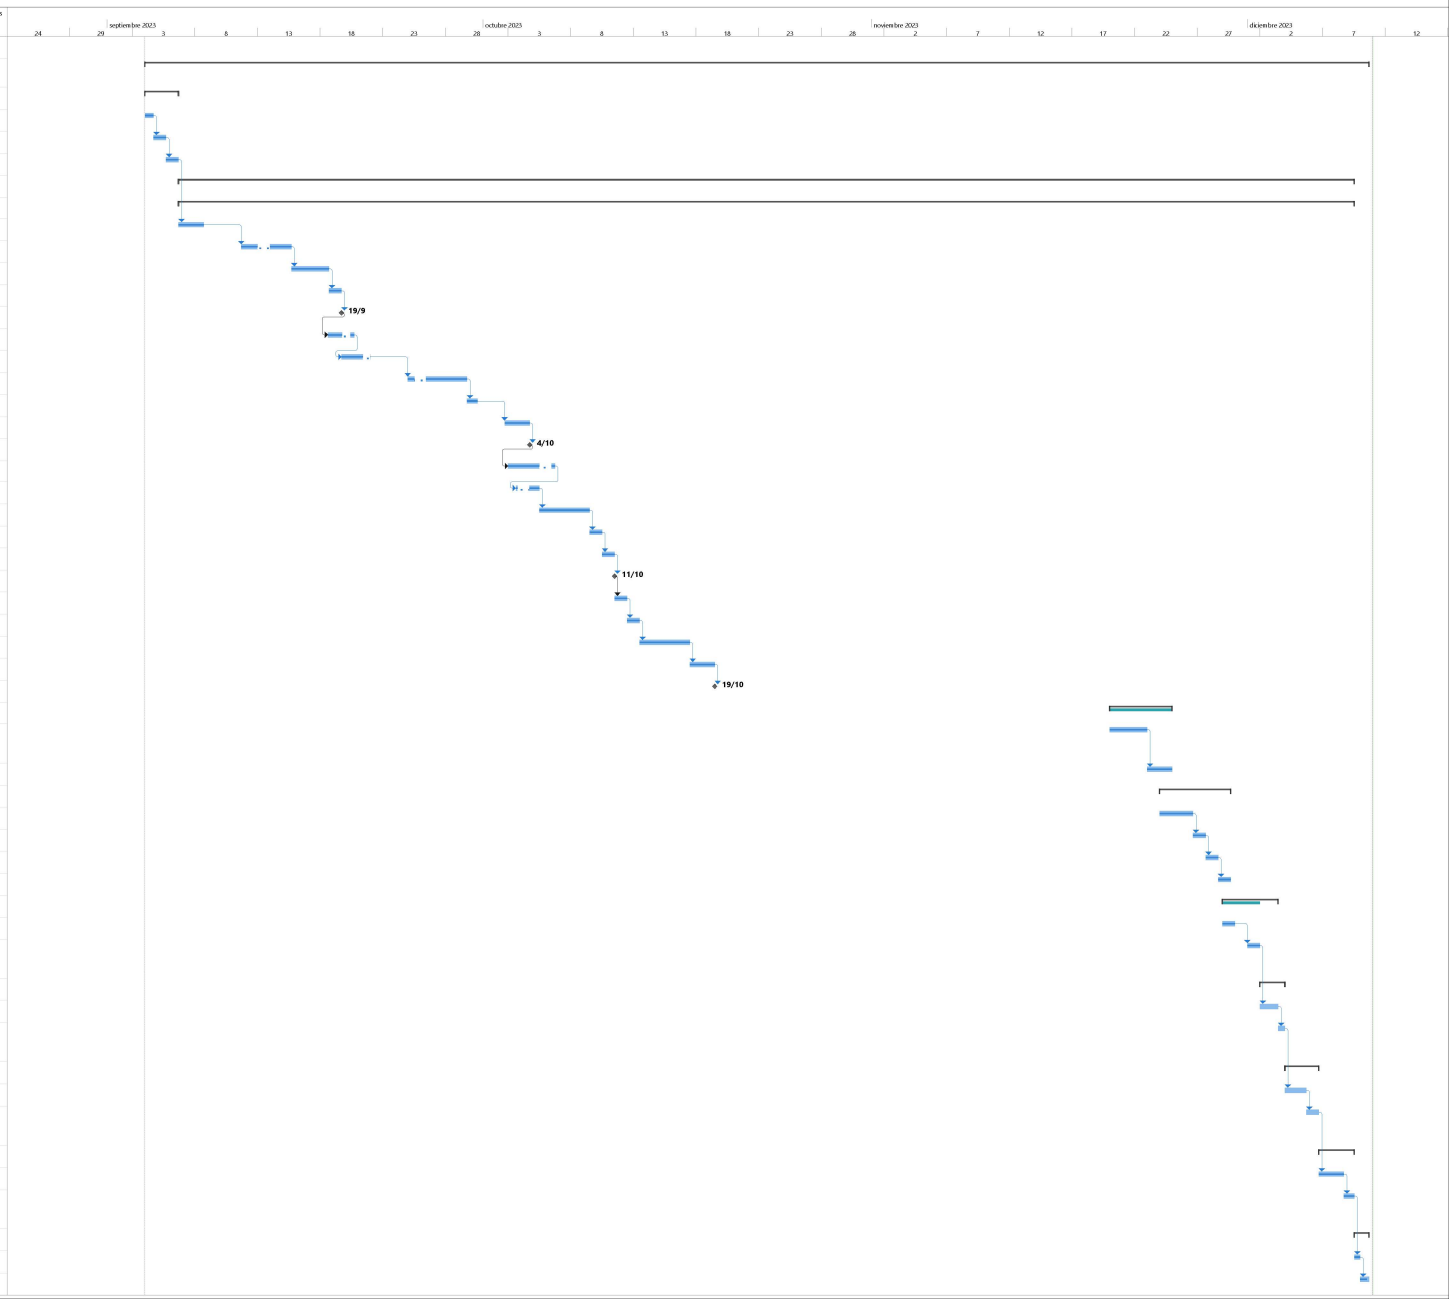


Proyecto: Cronograma SEMMA
Fecha: lun 11/12/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
